

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - DFO
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO Nº 09

Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, ETAPA 2 DAS ÁREAS DE OBRAS 6N, 7N E 08 .

Contrato 135/2024 **OS** 007/2024 **Convênio** 0402.320-73/2012

Endereço VILA TORRES GALVÃO E MARANGUAPE I.

Responsável Técnico BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO **CREA/CAU** 1819500357PE **Ref. ao Período**

Responsável BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO **Função** Eng^a Civil **01/08/2025**

Início da Obra 13/06/2024 **Término da Obra** 12/12/2025

Condição do tempo	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL	Dia da Visita - 01/08/2025						
MANHÃ	-	X	-	-	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
TARDE	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
NOITE	-	-	-	-							

Profissional →	Engenheiro	Encarregado	Carpinteiro	Pedreiro	Eletricista	Mestre obras	Servente	Vigia
Quantidade	1	1	-	4	-	-	9	
Equipamentos →	Betoneira	Vibrador	Gerador	Compressor	Andaime	Furadeira	Retro-Escav.	Cam. Munk
Quantidade	-	-	-	-	-	-	-	-

Atividades Realizadas

Descrição	Observação
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM (ITEM 1.3.1.): EXECUÇÃO ENTRE O PORTE E A CASA DE Nº 46A	Serviço não finalizado

Ocorrências

Comentários

Início da execução da drenagem inserindo a meia cana paralelo ao muro da casa de nº 46 A até as proximidades do poste onde ocorrerá o deságue na linha d'água.

Imagens



FOTO 01

Mariana Alves Gonçalves
Eng^a Civil
CREA 182140696-6 PE
Mat. 47.463

Fiscalização: Mariana Alves - Mat. 47.463

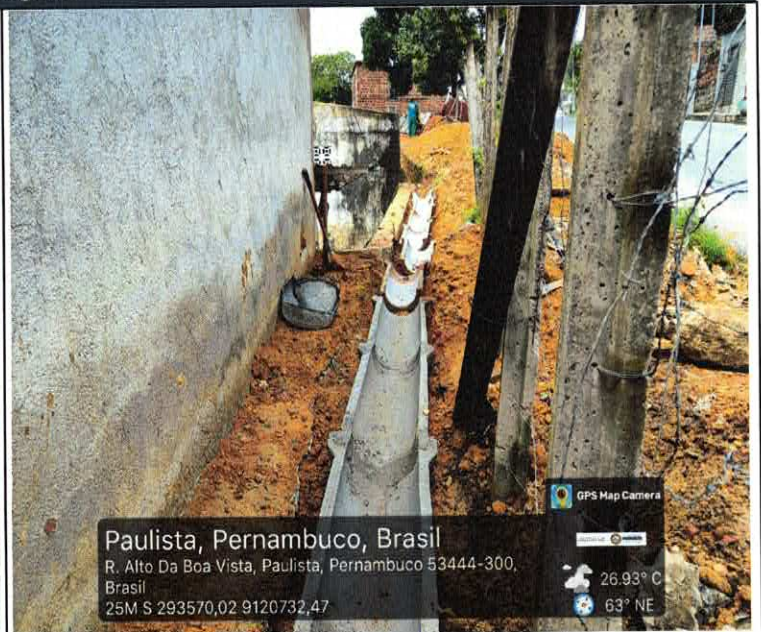


FOTO 02

Bruna P. O. Nascimento
Engenheira Civil

Construtora LSG - Eng^a Bruna Nascimento - CREA nº 1819500357PE

Secretário Executivo - Roberto F. Rocha - Mat. 47.345

Roberto Ferreira Rocha
Secretário Executivo
de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - DFO
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO Nº 09

Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, ETAPA 2 DAS ÁREAS DE OBRAS 6N, 7N E 08.

Contrato 135/2024 **OS** 007/2024 **Convênio** 0402.320-73/2012

Endereço VILA TORRES GALVÃO E MARANGUAPE I.

Responsável Técnico BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO **CREA/CAU** 1819500357PE **Ref. ao Período**

Responsável BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO **Função** Eng^a Civil **04/08/2025 a**

Início da Obra 13/06/2024 **Término da Obra** 12/12/2025 **08/08/2025**

Condição do tempo	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL	Dia da Visita - 06/08/2025							
MANHÃ	-	X	-	-	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	
TARDE	-	-	-	-	○	○	○	●	○	○	○	○
NOITE	-	-	-	-								
Profissional →	Engenheiro	Encarregado	Carpinteiro	Pedreiro	Eletricista	Mestre obras	Servente	Vigia				
Quantidade	1	1	-	4	-	-	9					
Equipamentos →	Betoneira	Vibrador	Gerador	Compressor	Andaime	Furadeira	Retro-Escav.	Cam. Munk				
Quantidade	-	-	-	-	-	-	-	-				

Atividades Realizadas	
Descrição	Observação
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM (ITEM 1.3.1.): EXECUÇÃO ENTRE O PORTE E A CASA DE Nº 46A	Serviço não finalizado
ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO (ITEM 1.2.11): CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO MURO EM ALVENARIA POR TRÁS DA CASA Nº 76.	Serviço não finalizado.

Ocorrências

Comentários

Segundo o encarregado da empresa responsável pela execução do muro de contenção, o serviço de REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO (ITEM 1.2.3) foi executado garantindo o nivelamento e a estabilidade necessária para a execução das etapas subsequentes. Além disso, informou que foram devidamente executados os serviços de CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (ITEM 1.2.10) com espessura de 5cm na base do muro localizado por trás da casa Nº 76, conforme especificado em projeto. Também foi dado início à execução da ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO (ITEM 1.2.11), com base dimensionada conforme projeto, apresentando altura de 0,60m e largura de 2,00 m a 2,55m, assegurando a resistência e a conformidade estrutural necessárias para a contenção.

Imagens

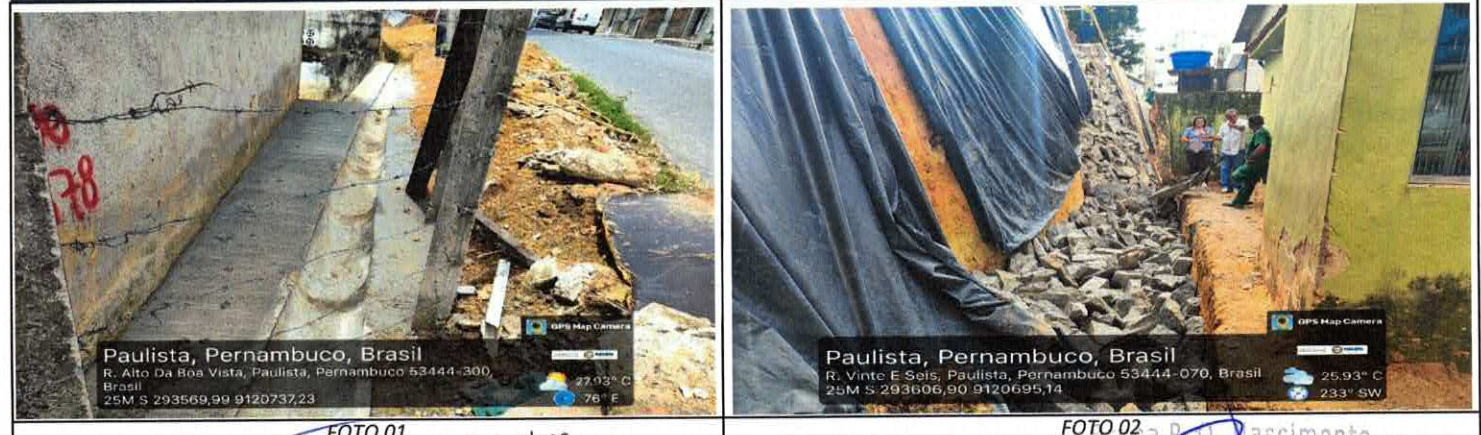


FOTO 01
Mariana Alves Gonçalves
Eng^a Civil
CREA 182140696-6 PE

Fiscalização: Mariana Alves - Matr. 47463

FOTO 02
Bruna P. O. Nascimento
Engenheira Civil
RNR 181950035-7

Construtora LSG - Eng^a Bruna Nascimento- CREA nº 1819500357PE

Roberto Ferreira Rocha
Secretário Executivo
de Infraestrutura

Secretário Executivo - Roberto F. Rocha - Matr. 47.345

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - DFO
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO Nº 09

Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, ETAPA 2 DAS ÁREAS DE OBRAS 6N, 7N E 08 .

Contrato 135/2024 **OS** 007/2024 **Convênio** 0402.320-73/2012

Endereço VILA TORRES GALVÃO E MARANGUAPE I.

Responsável Técnico BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO **CREA/CAU** 1819500357PE **Ref. ao Período**

Responsável BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO **Função** Eng^a Civil **11/08/2025 a**

Início da Obra 13/06/2024 **Término da Obra** 12/12/2025 **15/08/2025**

Condição do tempo	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL	Dia da Visita - 13/08/2025						
MANHÃ	X	-	-	-	Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb						
TARDE	-	-	-	-	○ ○ ○ ● ○ ○ ○						
NOITE	-	-	-	-							
Profissional →	Engenheiro	Encarregado	Carpinteiro	Pedreiro	Eletricista	Mestre obras	Servente	Vigia			
Quantidade	1	1	-	4	-	-	9				
Equipamentos →	Betoneira	Vibrador	Gerador	Compressor	Andaime	Furadeira	Retro-Escav.	Cam. Munk			
Quantidade	-	-	-	-	-	-	-	-			

Atividades Realizadas

Descrição	Observação
ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO (ITEM 1.2.11): CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO MURO EM ALVENARIA POR TRÁS DA CASA Nº 76.	Serviço não finalizado.

Ocorrências

Comentários

Imagens

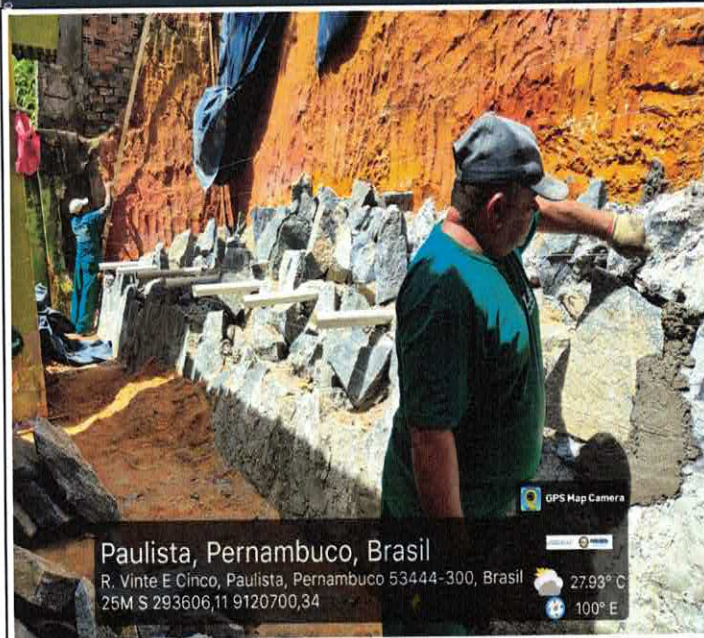


FOTO 01

Mariana Alves Gonçalves
Eng^a Civil
CREA 182140696-6 PE

Fiscalização: Mariana Alves - Mat. 47.463

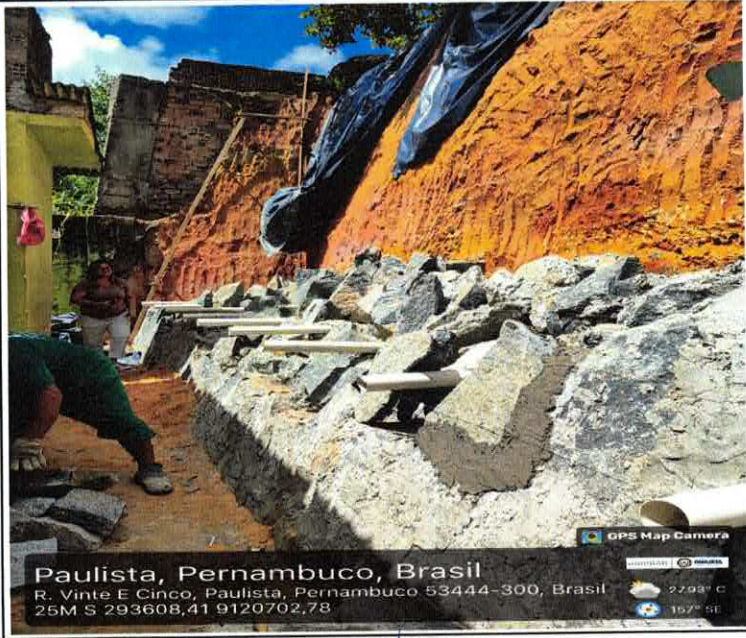


FOTO 02

Bruna P. Nascimento
Engenheira Civil
CREA 1819500357PE

Construtora LSG - Eng^a Bruna Nascimento- CREA nº 1819500357PE

Secretário Executivo - Roberto F. Rocha - Mat. 47.345

Roberto Ferreira Rocha
Secretário Executivo
de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - DFO
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO Nº 09

Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, ETAPA 2 DAS ÁREAS DE OBRAS 6N, 7N E 08 .

Contrato 135/2024 **OS** 007/2024 **Convênio** 0402.320-73/2012

Endereço VILA TORRES GALVÃO E MARANGUAPE I.

Responsável Técnico BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO **CREA/CAU** 1819500357PE **Ref. ao Período**

Responsável BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO **Função** Engª Civil **18/08/2025 a**

Início da Obra 13/06/2024 **Término da Obra** 12/12/2025 **22/08/2025**

Condição do tempo	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL	Dia da Visita - 21/08/2025						
MANHÃ	X	-	-	-	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
TARDE	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
NOITE	-	-	-	-							

Profissional →	Engenheiro	Encarregado	Carpinteiro	Pedreiro	Eletricista	Mestre obras	Servente	Vigia
Quantidade	1	1	-	4	-	-	9	
Equipamentos →	Betoneira	Vibrador	Gerador	Compressor	Andaime	Furadeira	Retro-Escav.	Cam. Munk
Quantidade	-	-	-	-	-	-	-	-

Atividades Realizadas	
Descrição	Observação
ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO (ITEM 1.2.11); CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO MURO EM ALVENARIA POR TRÁS DA CASA Nº 76.	Serviço não finalizado.
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA (ITEM 1.3.6)	Serviço não finalizado.

Ocorrências

Comentários

Imagens

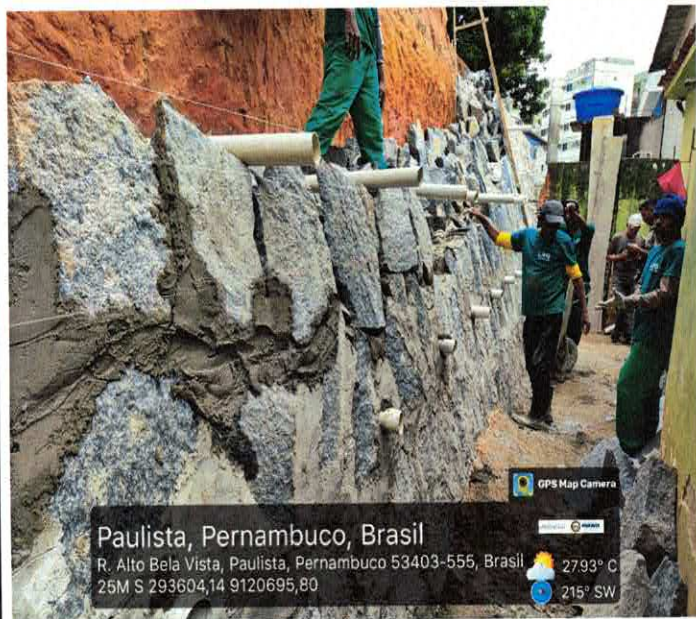


FOTO 01

Mariana Alves Gonçalves
Engª Civil
CREA 182140696-6 PE
Mat. 47.463

Fiscalização: Mariana Alves - Mat. 47.463



FOTO 02

Bruna P. Nascimento
Engª Civil
CREA 181950035-7

Construtora LSG - Engª Bruna Nascimento- CREA nº 1819500357PE

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - DFO
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA - RDO Nº 09

Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, ETAPA 2 DAS ÁREAS DE OBRAS 6N, 7N E 08 .

Contrato 135/2024 **OS** 007/2024 **Convênio** 0402.320-73/2012

Endereço VILA TORRES GALVÃO E MARANGUAPE I.

Responsável Técnico BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO **CREA/CAU** 1819500357PE **Ref. ao Período**

Responsável BRUNA PATRICIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO **Função** Engª Civil **25/08/2025 a**

Início da Obra 13/06/2024 **Término da Obra** 12/12/2025 **29/08/2025**

Condição do tempo	 SOL	 NUBLADO	 CHUVA	 IMPRATICÁVEL	Dia da Visita - 25/08/2025						
MANHÃ	-	X	-	-	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
TARDE	-	-	-	-	○	●	○	○	○	○	○
NOITE	-	-	-	-							

Profissional →	Engenheiro	Encarregado	Carpinteiro	Pedreiro	Eletricista	Mestre obras	Servente	Vigia
Quantidade	1	1	-	4	-	-	9	
Equipamentos →	Betoneira	Vibrador	Gerador	Compressor	Andaime	Furadeira	Retro-Escav.	Cam. Munk
Quantidade	-	-	-	-	-	-	-	-

Atividades Realizadas

Descrição	Observação
ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO (ITEM 1.2.11): CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO MURO EM ALVENARIA POR TRÁS DA CASA Nº 76.	Serviço não finalizado.

Ocorrências

Comentários

Imagens



FOTO 01

Mariana Alves Gonçalves
Engª Civil
CREA 182140696-6 PE
Mat. 47.463

Fiscalização: Mariana Alves - Mat. 47.463

Bruna P. Nascimento
Engenheira Civil
CREA 181950035-7

Construtora LSG - Engª Bruna Nascimento- CREA nº 1819500357PE

Secretário Executivo - Roberto F. Rocha - Mat. 47.345

Roberto Ferreira Rocha
Secretário Executivo
de Infraestrutura

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 09

ASSUNTO: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

CONTRATO: 135/2024

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

LOTE 03: 8



1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.


Mariana Alves Gonçalves
Eng^o Civil
CREA 182140696-6 PE
Mat.47.463


Bruno Ferreira
Eng^o Civil
CREA 182140696-6 PE
Mat.47.463


Bruna F. Nascimento
Eng^o Civil
RNT 181950035-7

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 09

ASSUNTO: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

CONTRATO: 135/2024

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

LOTE 03: 8



- 1.2.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO, COM SOQUETE (CASA Nº 76).
1.2.10 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO (CASA Nº 76).
1.2.11 ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6. (CASA Nº 76).



- 1.2.9. TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M. (CASA Nº 56)


Bruna R. Nascimento
Engenheira Civil
RG 181050035-7


Mariana Alves Gonçalves
Engª Civil
CREA 18214069
Mat.47.463


Roberto Ferreira Rocha
Secretário Executivo
de Infraestrutura

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 09

ASSUNTO: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

CONTRATO: 135/2024

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

LOTE 03: 8



1.2.11 ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6. (CASA Nº 76).

1.2.14. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (CASA Nº 76).




1.2.11 ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6. (CASA Nº 76).

1.2.14. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (CASA Nº 76).


Bruna M. Nascimento
Engenheira Civil
CREA 181450035-7


Mariana Alves Gonçalves
Engª Civil
CREA 182140696-6 PE
Mat.47.463


Roberto F. Rocha
Secretário Executivo
de Infraestrutura

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 09

ASSUNTO: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

CONTRATO: 135/2024

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

LOTE 03: 8




1.2.4. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (CASA 66).



1.2.4. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (CASA 76).


Bruna R. Nascimento
Engenheira Civil
RNE 121950035-7


Mariana Alves Gonçalves
Engª Civil
CREA 182140696-6 PE
Mat.47.463


Página 4 de 7
R. Rocha
Gerente Executivo
Infraestrutura

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 09

ASSUNTO: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

CONTRATO: 135/2024

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

LOTE 03: 8



1.3.1. CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM.



1.3.3. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - PARA ESGOTO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.


Bruna P. Nascimento
Engenheira Civil
RNP 114350035-7


Mariana Alves Gonçalves
Engª Civil
CREA 182140696-8 PE
MaL47.463


Roberto Ferreira Rocha
Secretário Executivo
de Infraestrutura


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 09

ASSUNTO: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

CONTRATO: 135/2024

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

LOTE 03: 8

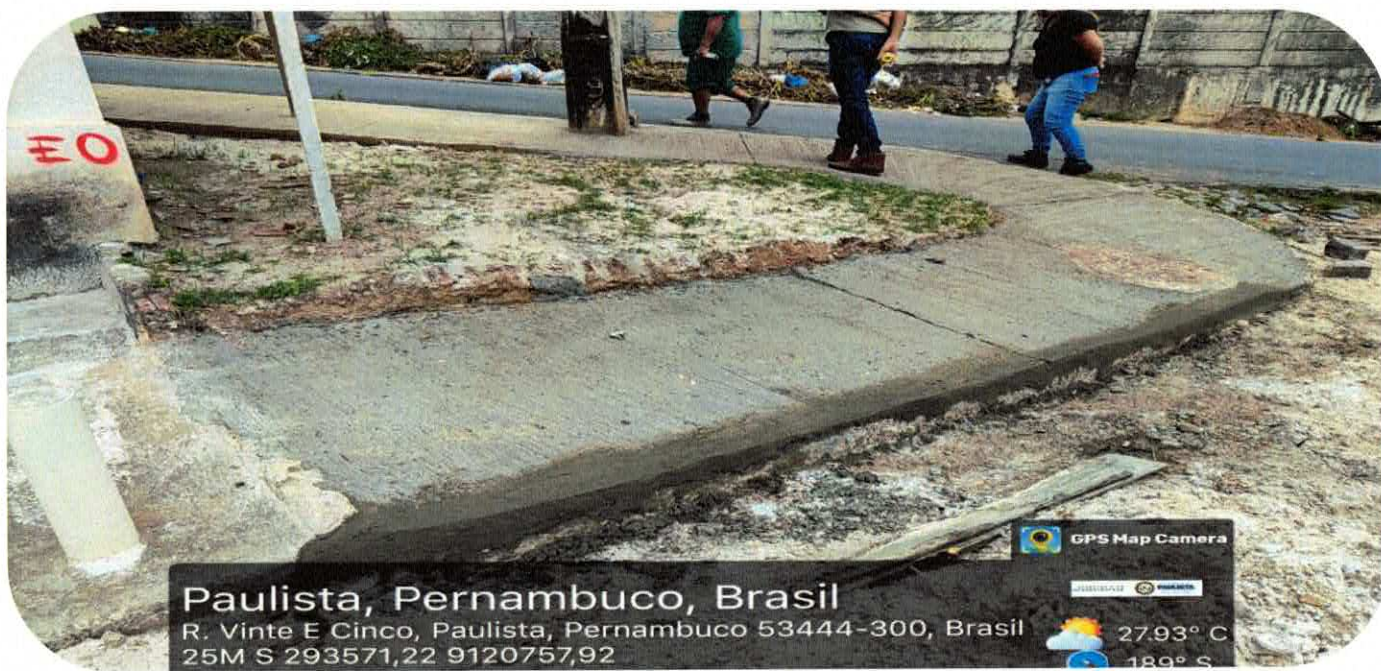

1.3.6. PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA



1.3.6. PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA


Bruna P.O. Nascimento
Eng. Civil
R. 181950035-7


Mariana Alves Gonçalves
Eng. Civil
CREA 182140696-6 PE
Mat. 47.463


Roberto Ferreira Rocha
Secretário Executivo
de Infraestrutura


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BM 09

ASSUNTO: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE.

CONTRATO: 135/2024

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

LOTE 03: 8

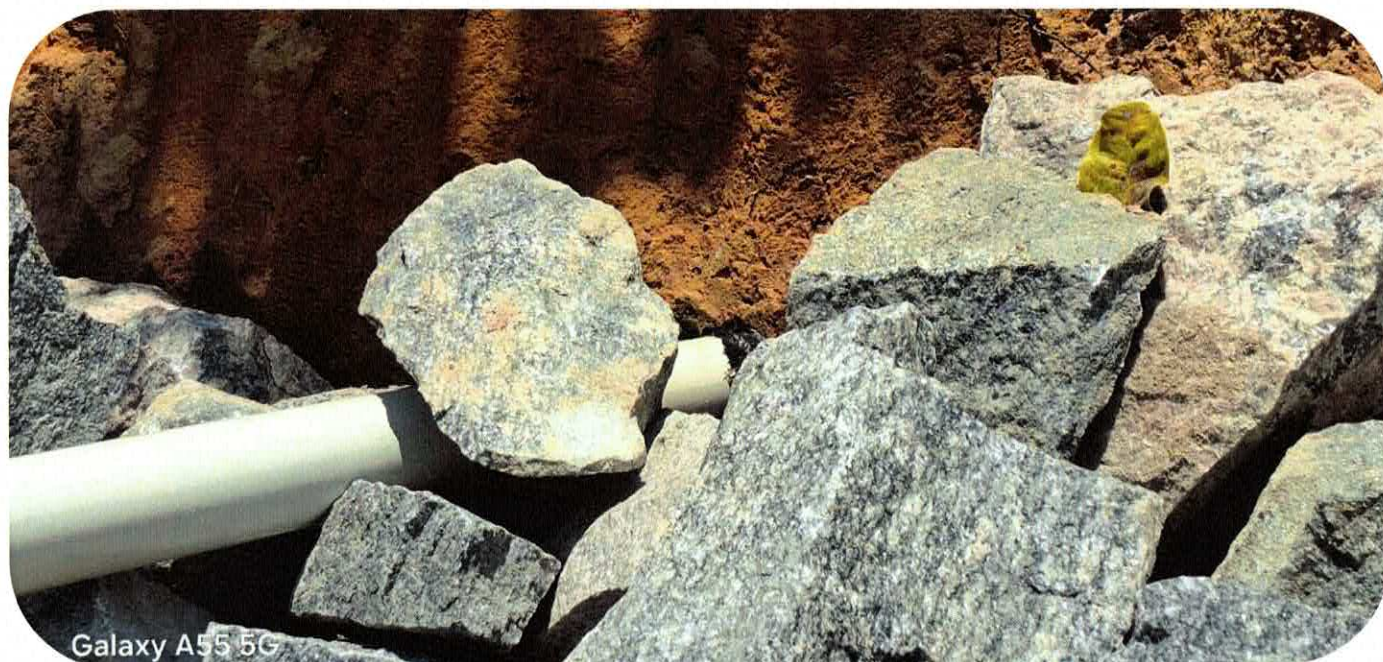

1.2.13. FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-31 (CASA 76).



1.2.13. FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-31 (CASA 76).


Bruna P. Nascimento
Engenheira Civil
RQE 011950035-7


Mariana Alves Gonçalves
Engª Civil
CREA 182140696-6 PE
Mat.47.463


Página 7 de 7
Roberto Ferreira Rocha
Secretário Executivo
de Infraestrutura
